
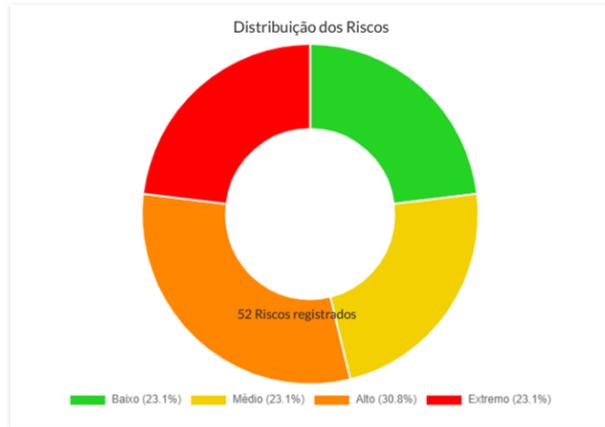


**1. Informações Básicas**

Processo nº: 23243.001636/2023-16  
 Objeto: Contratação de empresa para execução da reforma para readequação do setor de laticínios da agroindústria no Campus Alegrete  
 Data da criação: 10/3/2023

**2. Histórico das revisões** 1ª versão

**3. Responsáveis/Assinantes** Diogo Maus - SIAPE: 1299714  
 Wagner Dambros Fernandes - SIAPE: 2685271  
 Alice Rocha - SIAPE: 1515494

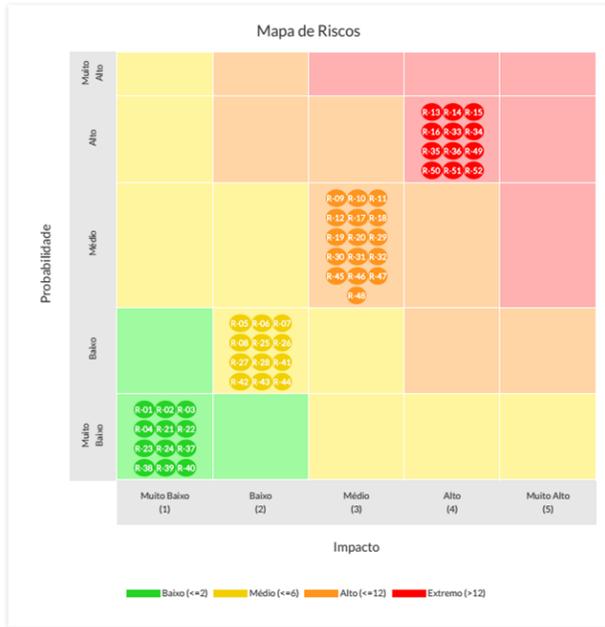

**5. Despacho da Autoridade Competente**

Luciano Borges de Castro - SIAPE: 1898564  
 Ana Rita Costenaro Parizi - SIAPE: 1788545

Mirian Kovhauht - SIAPE: 3107587  
 Pró-Reitora de Administração

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-01	Falta de comunicação interna adequada	Falta de canais de comunicação estabelecidos, falta de reuniões regulares, falta de clareza nas responsabilidades de comunicação.	Planejamento	Administração	Baixo
<b>Impactos</b>					
1	Pode resultar em informações inconsistentes e atrasos.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação	Responsável			
P-01	Estabelecer um fluxo de comunicação clara e regular.	Equipe de Planejamento			
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação	Responsável			
C-01	Designar uma pessoa para contato e controle de recebimento de documentos.	Equipe de Planejamento			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-02	Erros de documentação não críticos	Falta de revisão adequada, pressa na preparação dos documentos, falta de controle de qualidade.	Planejamento	Administração	Baixo
<b>Impactos</b>					
1	Pode levar a retrabalho e atrasos menores.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação	Responsável			
P-01	Realizar uma revisão cuidadosa dos documentos antes de sua emissão.	Equipe de Planejamento			
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação	Responsável			
C-01	Ter uma equipe de revisão pronta para corrigir os erros rapidamente.	Equipe de Planejamento			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-03	Mudanças menores nos requisitos	Falta de análise detalhada dos requisitos, falta de envolvimento dos stakeholders, mudanças de escopo imprevistas.	Planejamento	Administração	Baixo
<b>Impactos</b>					
1	Pode exigir ajustes no plano de licitação.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação	Responsável			
P-01	Realizar uma análise detalhada dos requisitos antes de iniciar o planejamento.	Equipe de Planejamento			
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação	Responsável			

C-01	Manter uma reserva de recursos para lidar com mudanças imprevistas.	Equipe de Planejamento
------	---	------------------------

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-04	Conflitos de agenda com membros da equipe	Falta de coordenação prévia das agendas, mudanças de prioridades, indisponibilidade dos membros da equipe.	Planejamento	Administração	Baixo
<b>Impactos</b>					
1	Pode causar atrasos nas reuniões de planejamento.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Coordenar as agendas com antecedência e definir datas e horários claros.				Equipe de Planejamento
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Realocar membros da equipe ou utilizar ferramentas de comunicação virtual para manter a colaboração.				Equipe de Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-05	Alterações significativas nos requisitos	Falta de compreensão completa dos requisitos, falta de comunicação com todas as partes envolvidas no processo, mudanças nas necessidades do projeto.	Planejamento	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
2	Pode exigir uma revisão completa do planejamento.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Manter uma comunicação aberta com as partes envolvidas para identificar possíveis alterações.				Equipe de Planejamento
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Avaliar o impacto das alterações e ajustar o plano de licitação conforme necessário.				Equipe de Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-06	Indisponibilidade de especialistas necessários	Falta de planejamento de recursos humanos, escassez de especialistas no mercado, indisponibilidade dos especialistas internos.	Planejamento	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
2	Pode levar a atrasos no desenvolvimento do plano.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Identificar e reservar especialistas relevantes com antecedência.				Equipe de Planejamento

Ações de Contingência		
Nº	Ação	Responsável
C-01	Encontrar alternativas, como consultoria externa ou treinamento interno.	Equipe de Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-07	Falta de acesso a informações relevantes	Restrições de compartilhamento de informações, falta de cooperação entre os órgãos envolvidos, documentos de referência indisponíveis	Planejamento	Administração	Médio

Impactos	
2	Pode prejudicar a elaboração de um plano completo.

Ações Preventivas		
Nº	Ação	Responsável
P-01	Estabelecer acordos de compartilhamento de informações com os órgãos envolvidos.	Equipe de Planejamento

Ações de Contingência		
Nº	Ação	Responsável
C-01	Buscar informações alternativas e utilizar fontes secundárias confiáveis.	Equipe de Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-08	Erros de estimativa de custos	Falta de análise detalhada dos custos, falta de experiência na estimativa, mudanças nos preços dos insumos.	Planejamento	Administração	Médio

Impactos	
2	Pode levar a problemas financeiros no decorrer da licitação.

Ações Preventivas		
Nº	Ação	Responsável
P-01	Realizar uma análise de custos detalhada e consultar especialistas internos ou externos.	Equipe de Planejamento

Ações de Contingência		
Nº	Ação	Responsável
C-01	Ter uma reserva financeira para lidar com custos imprevistos ou ajustar o escopo do projeto.	Equipe de Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-09	Alterações legislativas inesperadas	Mudanças nas leis e regulamentos, influências políticas, alterações nas políticas governamentais.	Planejamento	Administração	Alto

Impactos	
3	Pode exigir a revisão completa do plano de licitação.

Ações Preventivas		
Nº	Ação	Responsável

P-01	Monitorar regularmente as mudanças legislativas relevantes.	Equipe de Planejamento
<b>Ações de Contingência</b>		
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>
C-01	Consultar DCLC sobre o impacto das alterações e ajustar o plano.	Equipe de Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-10	Mudanças nos prazos estabelecidos	Revisão dos requisitos, atraso em atividades anteriores, mudanças nas prioridades dos stakeholders.	Planejamento	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
3	Pode causar atrasos significativos no processo de licitação.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Estabelecer prazos realistas e considerar uma margem de tempo para imprevistos.			Equipe de Planejamento	
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Negociar prazos alternativos com os stakeholders e ajustar o cronograma.			Equipe de Planejamento	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-11	Falta de apoio das partes interessadas	Falta de envolvimento das partes interessadas, falta de comunicação eficaz, interesses conflitantes entre as partes.	Planejamento	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
3	Pode dificultar a obtenção de recursos e informações necessárias.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Engajar as partes interessadas desde o início do processo de planejamento.			Equipe de Planejamento	
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Identificar e envolver partes interessadas alternativas, se necessário.			Equipe de Planejamento	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-12	Conflitos de interesse entre as partes envolvidas	Competição desleal, interesses pessoais em conflito, falta de transparência nas relações entre as partes.	Planejamento	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
3	Pode comprometer a integridade do processo de licitação.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>

P-01	Estabelecer diretrizes claras de ética e conduta para todos os envolvidos.	Equipe de Planejamento
<b>Ações de Contingência</b>		
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>
C-01	Designar um mediador neutro para resolver conflitos e garantir a transparência.	Equipe de Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-13	Instabilidade política ou social	Mudanças de governo, protestos, situações de crise social.	Planejamento	Administração	ALTO
<b>Impactos</b>					
4	Pode levar à suspensão ou cancelamento da licitação.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Realizar uma análise de cenários políticos e sociais antes do planejamento.				Equipe de Planejamento
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Desenvolver um plano alternativo de licitação ou adiar a licitação, se necessário.				Equipe de Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-14	Falhas no sistema de tecnologia da informação	Falta de manutenção adequada, vulnerabilidades de segurança, falhas técnicas inesperadas.	Planejamento	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
4	Pode resultar em perda de dados e atrasos graves.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Realizar testes completos do sistema e manter backups regulares.				Equipe de Planejamento
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Ter um plano de recuperação de desastres para restaurar rapidamente o sistema em caso de falhas.				Equipe de Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-15	Problemas de segurança de informações	Falta de protocolos de segurança adequados, acesso não autorizado, ataques cibernéticos.	Planejamento	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
4	Pode levar à divulgação de informações sensíveis.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>

P-01	Implementar medidas de segurança adequadas, como criptografia e controle de acesso.	Equipe de Planejamento
<b>Ações de Contingência</b>		
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>	<b>Responsável</b>
C-01	Ter um plano de resposta a incidentes de segurança e notificar imediatamente as partes afetadas.	Equipe de Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-16	Recursos humanos insuficientes ou indisponíveis	Subestimação das necessidades de recursos humanos, falta de planejamento de contingência, dificuldades na contratação de pessoal qualificado.	Planejamento	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
4	Pode resultar em sobrecarga de trabalho e atrasos				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Realizar uma análise de recursos humanos necessários e identificar possíveis deficiências.				Equipe de Planejamento
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Contratar recursos temporários ou redistribuir tarefas entre a equipe existente.				Equipe de Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-17	Litígios ou contestações legais	Interpretações divergentes dos requisitos, falta de documentação adequada, discordâncias entre os licitantes.	Planejamento	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
3	Pode atrasar ou suspender o processo de licitação.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Realizar uma análise jurídica detalhada e garantir o cumprimento das regulamentações.				Equipe de Planejamento
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Ter uma equipe jurídica pronta para responder a litígios e adotar medidas legais apropriadas.				Equipe de Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-18	Falta de capacidade financeira do licitante selecionado	Má avaliação da capacidade financeira, mudanças na situação financeira da empresa, falta de garantias contratuais adequadas.	Planejamento	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
3	Pode levar ao cancelamento ou revisão do contrato.				

Ações Preventivas		
Nº	Ação	Responsável
P-01	Realizar uma análise financeira rigorosa dos licitantes.	Equipe de Planejamento
Ações de Contingência		
Nº	Ação	Responsável
C-01	Estabelecer cláusulas contratuais para garantir o desempenho financeiro e ter licitantes alternativos em reserva.	Equipe de Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-19	Desvios éticos por parte de licitantes ou membros da equipe	Falta de políticas éticas claras, pressão para obter vantagens indevidas, falta de monitoramento e controle.	Planejamento	Administração	Alto

Impactos	
3	Pode comprometer a integridade do processo de licitação.

Ações Preventivas		
Nº	Ação	Responsável
P-01	Estabelecer um código de ética claro e realizar verificações de antecedentes dos licitantes.	Equipe de Planejamento
Ações de Contingência		
Nº	Ação	Responsável
C-01	Implementar medidas de monitoramento e denunciar quaisquer desvios éticos às autoridades apropriadas.	Equipe de Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-20	Mudanças macroeconômicas imprevistas	Instabilidade econômica global, flutuações cambiais, mudanças nas políticas econômicas do país.	Planejamento	Administração	Médio

Impactos	
3	Pode afetar os custos e a viabilidade financeira do projeto.

Ações Preventivas		
Nº	Ação	Responsável
P-01	Realizar análises de mercado e cenários econômicos antes da licitação.	Equipe de Planejamento
Ações de Contingência		
Nº	Ação	Responsável
C-01	Avaliar o impacto das mudanças econômicas e ajustar o plano de licitação, se necessário.	Equipe de Planejamento

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-01	Atraso na entrega de documentos fiscais	Falta de organização do fornecedor ou problemas logísticos.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
<b>Impactos</b>					
1	Possível adiamento de pagamentos				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Estabelecer um cronograma claro para a entrega de documentos fiscais;				Equipe de Planejamento e Pregoeiro
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Avaliar a possibilidade de aceitar documentos enviados com pequenos atrasos ou buscar fornecedores alternativos.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-02	Fornecedores com histórico de baixa qualidade	Falta de controle de qualidade ou ausência de padrões adequados.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
<b>Impactos</b>					
1	Produtos/serviços de baixa qualidade podem afetar negativamente a qualidade final do projeto.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Realizar pesquisas de mercado e análise de histórico dos fornecedores antes de incluí-los na lista de possíveis candidatos.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Ter fornecedores alternativos pré-selecionados caso haja necessidade de substituição.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-03	Falta de experiência do fornecedor no setor específico do projeto	Inexperiência do fornecedor em lidar com projetos semelhantes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
<b>Impactos</b>					
1	O fornecedor pode ter dificuldades em atender às necessidades específicas do projeto.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Estabelecer critérios de seleção que incluam experiência no setor como um requisito obrigatório.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Identificar fornecedores alternativos com experiência no setor específico do projeto.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-04	Falta de transparência no processo de seleção	Falta de diretrizes claras ou influência indevida.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
<b>Impactos</b>					
1	Pode gerar desconfiança e questionamentos sobre a integridade da licitação.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Estabelecer diretrizes claras para o processo de seleção e garantir a imparcialidade e transparência em todas as etapas.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Disponibilizar um canal de comunicação para que os fornecedores possam reportar qualquer suspeita de falta de transparência.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-05	Fornecedores com capacidade insuficiente para atender à demanda do projeto	Falta de recursos ou limitações de produção.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
2	O fornecedor pode não conseguir entregar os produtos/serviços dentro do prazo estipulado.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Realizar uma análise de capacidade dos fornecedores antes da seleção, levando em consideração a demanda do projeto.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Estabelecer contratos com cláusulas que garantam penalidades em caso de descumprimento de prazos.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-06	Falta de padronização na documentação fornecida pelos candidatos	Falta de orientação ou falta de atenção dos fornecedores.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
2	Dificuldade na comparação e análise dos documentos recebidos.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Fornecer um checklist claro com os documentos necessários e solicitar que sejam apresentados de forma padronizada.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Designar uma equipe para revisar e interpretar os documentos caso haja divergências ou falta de clareza.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-07	Mudança na legislação que afeta o processo de licitação	Atualizações legais ou regulatórias imprevistas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
2	Pode gerar a necessidade de revisão dos critérios e prazos estabelecidos, atrasando o processo de seleção.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Monitorar regularmente as mudanças na legislação e atualizar os critérios de seleção conforme necessário.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Ter um plano de contingência que inclua possíveis ajustes no processo de seleção caso ocorram mudanças na legislação.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-08	Fornecedores que não cumprem os requisitos técnicos exigidos	Falta de habilidades ou capacidades técnicas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
2	Os produtos/serviços podem não atender às necessidades técnicas do projeto.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Estabelecer critérios claros e detalhados para os requisitos técnicos e exigir comprovação documental.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Realizar testes de aceitação dos produtos/serviços antes de firmar o contrato e ter fornecedores alternativos em reserva.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-09	Falta de concorrência entre os fornecedores	Restrição do mercado ou falta de divulgação adequada.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
3	Pode resultar em preços não competitivos e falta de opções de escolha.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Divulgar amplamente a licitação e buscar atrair um número adequado de fornecedores interessados.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Realizar negociações adicionais com os fornecedores para obter preços mais competitivos ou considerar realizar uma nova licitação.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-10	Instabilidade financeira do fornecedor	Dificuldades financeiras da empresa fornecedora.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
3	O fornecedor pode enfrentar dificuldades financeiras e não conseguir cumprir com seus compromissos contratuais.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Realizar uma análise da saúde financeira dos fornecedores antes da seleção.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Estabelecer garantias contratuais, como seguros ou caução, para minimizar os impactos financeiros em caso de falência ou inadimplência do fornecedor.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-11	Falta de capacidade de entrega dentro do prazo	Sobrecarga de trabalho ou problemas operacionais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
3	Pode causar atrasos no cronograma do projeto e prejudicar outras etapas dependentes do fornecedor.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Estabelecer prazos realistas e incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades em caso de atrasos.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Ter fornecedores alternativos pré-selecionados ou estabelecer acordos de cooperação com outros fornecedores para suprir a demanda em caso de				Equipe de Planejamento e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-12	Desconhecimento das regras e regulamentações da licitação	Falta de informações ou interpretação incorreta das regras.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
3	O fornecedor pode cometer erros ou não atender a requisitos específicos, gerando impugnações ou desclassificação.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Fornecer orientações claras e detalhadas sobre as regras e regulamentações da licitação.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Estabelecer um canal de comunicação para esclarecimento de dúvidas e realizar reuniões técnicas para explicar os requisitos da licitação.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-13	Fornecedores fraudulentos ou de má-fé	Intenção deliberada de enganar ou fraudar.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo
<b>Impactos</b>					
4	O fornecedor pode fornecer informações falsas ou enganosas e não cumprir com as obrigações contratuais.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Realizar uma análise rigorosa dos fornecedores, incluindo verificação de referências e histórico de negócios.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades significativas em caso de fraude ou má-fé, além de realizar auditorias periódicas no fornecedor.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-14	Mudanças políticas ou governamentais que afetam a seleção do fornecedor	Alterações na legislação ou na política governamental.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo
<b>Impactos</b>					
4	Pode gerar a necessidade de revisão dos critérios de seleção e até mesmo cancelamento da licitação.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Monitorar o ambiente político e governamental para identificar possíveis mudanças que possam afetar a seleção.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Ter um plano de contingência que inclua ajustes rápidos aos critérios de seleção e, se necessário, iniciar um novo processo de licitação.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-15	Fornecedores com problemas de ética ou reputação questionável	Má conduta ou histórico negativo.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo
<b>Impactos</b>					
4	A associação com fornecedores com problemas de ética ou má reputação pode prejudicar a imagem e credibilidade da organização.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Realizar uma pesquisa minuciosa sobre a reputação dos fornecedores, incluindo consultas a órgãos reguladores e revisão de casos anteriores.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Ter fornecedores alternativos pré-selecionados e um plano de comunicação preparado para lidar com possíveis problemas de reputação.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-16	Catástrofes naturais ou eventos imprevisíveis que afetam os fornecedores	Ocorrência de eventos como desastres naturais ou crises globais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Extremo
<b>Impactos</b>					
4	Pode interromper a capacidade dos fornecedores de cumprir com os compromissos contratuais.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação				Responsável
P-01	Avaliar a localização geográfica dos fornecedores e considerar a possibilidade de eventos imprevisíveis em seu planejamento.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação				Responsável
C-01	Ter um plano de contingência que inclua a possibilidade de buscar fornecedores em áreas não afetadas ou considerar a postergação do processo de licitação.				Equipe de Planejamento e Pregoeiro

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-01	Falta de comunicação adequada entre as partes envolvidas	Falta de canais de comunicação definidos ou falta de clareza na comunicação.	Gestão do Contrato	Administração	Baixo
<b>Impactos</b>					
1	Pode resultar em atrasos na tomada de decisões, mal-entendidos e falta de alinhamento.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação	Responsável			
P-01	Estabelecer canais de comunicação claros e definir responsabilidades de comunicação para cada parte.	Gestor e Fiscal do Contrato			
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação	Responsável			
C-01	Realizar reuniões regulares de acompanhamento e estabelecer um plano de comunicação de emergência.	Gestor e Fiscal do Contrato			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-02	Falta de monitoramento efetivo do desempenho do fornecedor	Falta de indicadores de desempenho definidos ou falta de recursos dedicados ao monitoramento.	Gestão do Contrato	Administração	Baixo
<b>Impactos</b>					
1	Pode resultar em fornecedores com desempenho insatisfatório, baixa qualidade dos produtos/serviços e não cumprimento dos prazos.				
<b>Ações Preventivas</b>					
Nº	Ação	Responsável			
P-01	Definir indicadores de desempenho claros e estabelecer um sistema de monitoramento regular.	Gestor e Fiscal do Contrato			
<b>Ações de Contingência</b>					
Nº	Ação	Responsável			
C-01	Realizar revisões periódicas do desempenho do fornecedor e implementar medidas corretivas quando necessário.	Gestor e Fiscal do Contrato			

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------

R-03	Falta de cumprimento dos prazos contratuais por parte do fornecedor	Problemas operacionais ou falta de comprometimento do fornecedor.	Gestão do Contrato	Administração	Baixo
<b>Impactos</b>					
1	Atrasos no cronograma do projeto, custos adicionais e possíveis penalidades contratuais.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Estabelecer prazos realistas e incluir cláusulas contratuais que prevejam penalidades em caso de atrasos.				Gestor e Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Ter um plano de contingência que inclua fornecedores alternativos pré-selecionados caso haja atrasos significativos.				Gestor e Fiscal do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-04	Falta de registros e documentação adequada do contrato	Falta de controle ou negligência na manutenção de registros e documentos.	Gestão do Contrato	Administração	Baixo
<b>Impactos</b>					
1	Dificuldade na comprovação de obrigações contratuais, rastreamento de histórico e resolução de disputas.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Estabelecer um sistema de gerenciamento de documentos e registros claros desde o início do contrato.				Gestor e Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Realizar auditorias regulares dos registros e documentação para garantir sua integridade e atualização.				Gestor e Fiscal do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------

R-05	Mudanças nas necessidades e requisitos do projeto	Evolução das necessidades ou objetivos do projeto durante a sua execução.	Gestão do Contrato	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
2	Pode gerar a necessidade de revisão do contrato, atrasos e custos adicionais.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Realizar uma análise abrangente dos requisitos do projeto antes de firmar o contrato e incluir cláusulas que prevejam possíveis mudanças.				Gestor e Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Estabelecer um processo formal de solicitação de mudanças e renegociação de termos contratuais.				Gestor e Fiscal do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-06	Falhas no gerenciamento de pagamentos e faturamento	Erros no processamento de pagamentos ou faturamento inadequado.	Gestão do Contrato	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
2	Pode resultar em atrasos nos pagamentos, desequilíbrio financeiro e disputas contratuais.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Estabelecer procedimentos claros para o processamento de pagamentos e faturamento, incluindo revisões e verificações de qualidade.				Gestor e Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Ter um plano de contingência que inclua uma reserva financeira para lidar com possíveis atrasos ou problemas de pagamento.				Gestor e Fiscal do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------

R-07	Falta de cumprimento de obrigações contratuais por parte do contratante	Falta de recursos, mudanças de prioridades ou negligência por parte do contratante.	Gestão do Contrato	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
2	Pode resultar em atrasos na execução do projeto, desmotivação do fornecedor e possíveis disputas contratuais.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Estabelecer uma estrutura de governança clara, com responsabilidades e recursos definidos para o cumprimento das obrigações contratuais.				Gestor e Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Realizar revisões regulares das obrigações contratuais e ter um plano de contingência caso o contratante não cumpra suas obrigações.				Gestor e Fiscal do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-08	Falta de expertise técnica na equipe de gestão do contrato	Falta de conhecimento ou experiência adequada na equipe de gestão do contrato.	Gestão do Contrato	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
2	Dificuldade na avaliação do desempenho do fornecedor, compreensão de questões técnicas e tomada de decisões informadas.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Assegurar que a equipe de gestão do contrato tenha conhecimento e experiência adequados na área técnica relacionada ao contrato.				Gestor e Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Buscar orientação especializada externa ou treinamento adicional para a equipe de gestão do contrato quando necessário.				Gestor e Fiscal do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------

R-09	Mudança na legislação que afeta o contrato	Atualizações legais ou regulatórias imprevistas.	Gestão do Contrato	Administração	Médio
<b>Impactos</b>					
3	Pode exigir a revisão ou modificação do contrato, resultando em atrasos e custos adicionais.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Monitorar regularmente as mudanças na legislação e manter-se atualizado sobre os requisitos legais aplicáveis ao contrato.				Gestor e Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Ter um plano de contingência que inclua a revisão do contrato em caso de mudanças legislativas e ação legal, se necessário.				Gestor e Fiscal do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-10	Deterioração financeira do fornecedor	Problemas financeiros enfrentados pelo fornecedor durante a execução do contrato.	Gestão do Contrato	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
3	O fornecedor pode enfrentar dificuldades financeiras e não conseguir cumprir com suas obrigações contratuais.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Realizar uma análise financeira detalhada do fornecedor antes de firmar o contrato e monitorar sua situação financeira ao longo do tempo.				Gestor e Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Estabelecer garantias contratuais, como caução ou seguros, para mitigar o risco financeiro do fornecedor.				Gestor e Fiscal do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------

R-11	Mudança nas condições econômicas que afetam o contrato	Flutuações econômicas imprevistas, como inflação, variações cambiais ou recessões.	Gestão do Contrato	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
3	Pode afetar os custos do projeto, a viabilidade financeira do fornecedor e a capacidade de cumprir com as obrigações contratuais.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Realizar análises de sensibilidade financeira para identificar os impactos potenciais das mudanças nas condições econômicas.				Gestor e Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Incluir cláusulas contratuais que permitam a revisão de preços ou condições em caso de mudanças econômicas significativas.				Gestor e Fiscal do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-12	Falhas no controle de qualidade do fornecedor	Falhas nos processos de controle de qualidade ou falta de conformidade com os requisitos acordados.	Gestão do Contrato	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
3	Pode resultar em produtos/serviços de baixa qualidade, insatisfação do cliente e retrabalho.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Estabelecer critérios de qualidade claros e definir procedimentos de controle de qualidade robustos.				Gestor e Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Realizar inspeções e testes regulares nos produtos/serviços fornecidos para garantir a conformidade com os requisitos contratuais.				Gestor e Fiscal do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------

R-13	Rescisão de contrato por parte do fornecedor	Problemas financeiros, falhas contratuais graves ou circunstâncias imprevistas.	Gestão do Contrato	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
4	Interrupção do projeto, necessidade de buscar fornecedores alternativos e possíveis disputas legais.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Realizar uma análise minuciosa da capacidade financeira e histórico do fornecedor antes de firmar o contrato.				Gestor e Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Estabelecer cláusulas contratuais que prevejam penalidades em caso de rescisão e ter fornecedores alternativos pré-selecionados.				Gestor e Fiscal do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-14	Atraso significativo na entrega dos produtos/serviços contratados	Problemas operacionais, falta de recursos ou má gestão por parte do fornecedor.	Gestão do Contrato	Administração	Alto
<b>Impactos</b>					
4	Atraso no cronograma do projeto, desequilíbrio financeiro e insatisfação do cliente.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Definir prazos claros e realistas no contrato, com cláusulas que prevejam penalidades em caso de atrasos.				Gestor e Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Ter um plano de contingência que inclua fornecedores alternativos pré-selecionados e a possibilidade de buscar medidas legais para garantir a entrega dos produtos/serviços.				Gestor e Fiscal do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
--------	-------	----------------	------	--------------	------------------------

R-15	Falta de conformidade com normas e regulamentações aplicáveis	Falta de conhecimento, negligência ou mudanças nas normas e regulamentações.	Gestão do Contrato	Administração	Extremo
<b>Impactos</b>					
4	Possíveis multas, paralisação do projeto, danos à reputação da organização.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Realizar uma análise detalhada das normas e regulamentações aplicáveis e incluir cláusulas contratuais que exijam a conformidade.				Gestor e Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Monitorar regularmente a conformidade do fornecedor e estabelecer um plano de ação corretiva em caso de não conformidade identificada.				Gestor e Fiscal do Contrato

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)
R-16	Litígios ou disputas contratuais prolongadas	Interpretação divergente de cláusulas contratuais, atrasos significativos ou descumprimento de obrigações contratuais.	Gestão do Contrato	Administração	Extremo
<b>Impactos</b>					
4	Custos legais elevados, atrasos no projeto e desgaste na relação entre as partes envolvidas.				
<b>Ações Preventivas</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
P-01	Redigir cláusulas contratuais claras e precisas, além de promover uma comunicação efetiva e colaborativa entre as partes.				Gestor e Fiscal do Contrato
<b>Ações de Contingência</b>					
<b>Nº</b>	<b>Ação</b>				<b>Responsável</b>
C-01	Estabelecer um plano de resolução de disputas que inclua negociações, mediação ou arbitragem como alternativas ao litígio.				Gestor e Fiscal do Contrato
